B-Plan 158 in Pattensen

Werretal Urbanisations GmbH

Depenbrock Bau GmbH & Co. KG
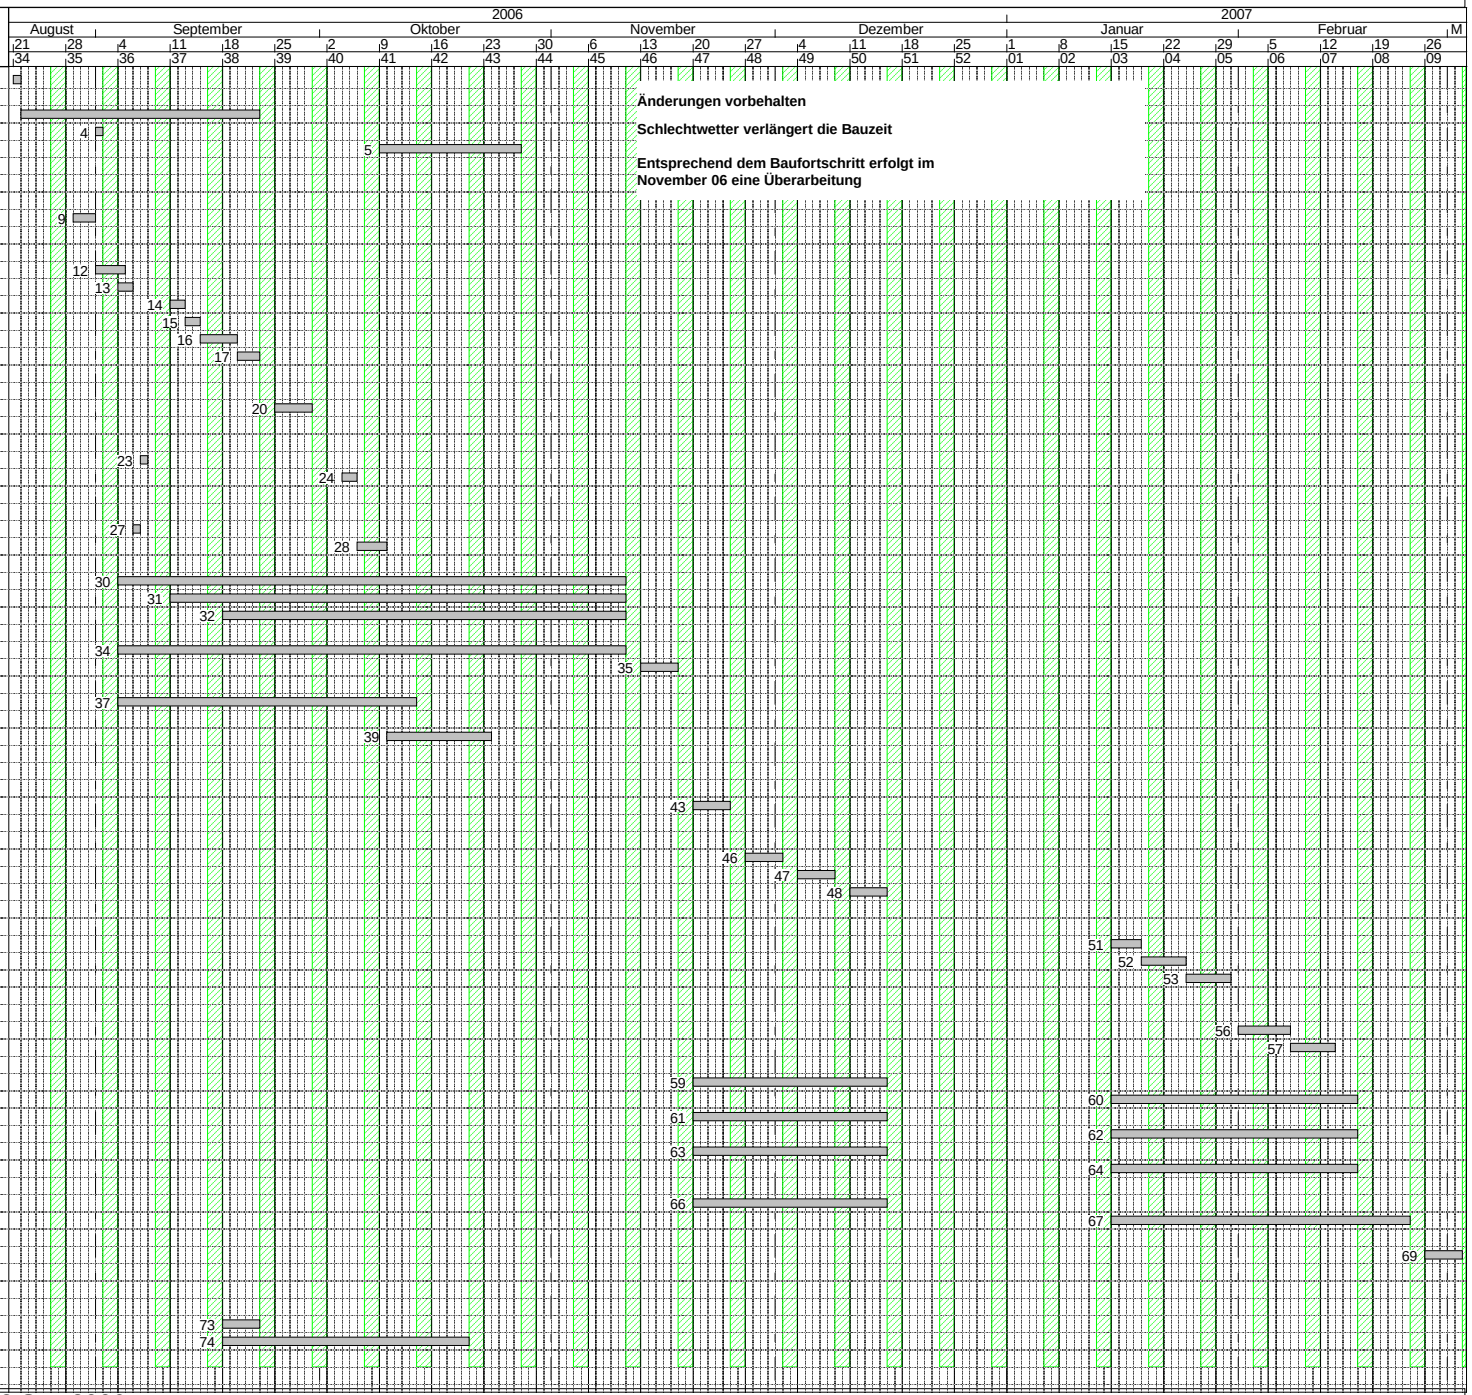
	Titel	Start	Balken Dauer	Ende
1	Baustelleneinrichtung	21.Aug.2006	1	21.Aug.2006
2			0	
3	Oberbodenabtrag	22.Aug.2006	24	22.Sep.2006
4	Bodenstabilisierung	01.Sep.2006	1	01.Sep.2006
5	Bodenstabilisierung	09.Okt.2006	15	27.Okt.2006
6			0	
7	**Südlicher Bauabschnitt:**		0	
8	Kopenhagener Weg		0	
9	R14-R13-R12	29.Aug.2006	3	31.Aug.2006
10			0	
11	Pariser Allee		0	
12	R12-R11-R10	01.Sep.2006	2	04.Sep.2006
13	R10-R9-R8	04.Sep.2006	2	05.Sep.2006
14	R8-R7-R6	11.Sep.2006	2	12.Sep.2006
15	R6-R5-R4	13.Sep.2006	2	14.Sep.2006
16	R3-R2-R1	15.Sep.2006	3	19.Sep.2006
17	R14-15-RBF	20.Sep.2006	3	22.Sep.2006
18			0	
19	RW-Kanal Warschauer Straße (1. Abschnitt)		0	
20	R7-R20-R19-R18-R17-R16	25.Sep.2006	5	29.Sep.2006
21			0	
22	RW-Kanal Athener Weg		0	
23	R24-R23	07.Sep.2006	1	07.Sep.2006
24	R23-R22-R21	04.Okt.2006	2	05.Okt.2006
25			0	
26	RW-Kanal Wiener Weg		0	
27	R28-R27	06.Sep.2006	1	06.Sep.2006
28	R27-R26-R25	06.Okt.2006	2	09.Okt.2006
29			0	
30	Abwasserdruckleitung	04.Sep.2006	50	10.Nov.2006
31	Wasserleitung	11.Sep.2006	45	10.Nov.2006
32	Versorgungsleitungen	18.Sep.2006	40	10.Nov.2006
33			0	
34	Baustraße	04.Sep.2006	50	10.Nov.2006
35	bituminöse Baustraße	13.Nov.2006	5	17.Nov.2006
36			0	
37	RBF	04.Sep.2006	30	13.Okt.2006
38			0	
39	Rückbau Feldweg Alte Mühle	10.Okt.2006	10	23.Okt.2006
40			0	
41	**Nördlicher Bauabschnitt:**		0	
42	Pariser Allee		0	
43	R12-R37-R36-R229	20.Nov.2006	5	24.Nov.2006
44			0	
45	Helsinkiring - Wiener Weg		0	
46	R36-R35-R34	27.Nov.2006	5	01.Dez.2006
47	R34-R33-R32	04.Dez.2006	5	08.Dez.2006
48	R32-R31-R30	11.Dez.2006	5	15.Dez.2006
49			0	
50	Stockholmer Straße		0	
51	R15-R43	15.Jan.2007	4	18.Jan.2007
52	R43-R42	19.Jan.2007	4	24.Jan.2007
53	R42-R41	25.Jan.2007	4	30.Jan.2007
54			0	
55	Warschauer Straße (2. Abschnitt)		0	
56	R41-R40-R39	01.Feb.2007	5	07.Feb.2007
57	R39-R38	08.Feb.2007	4	13.Feb.2007
58			0	
59	Abwasserdruckleitung	20.Nov.2006	20	15.Dez.2006
60	Abwasserdruckleitung	15.Jan.2007	25	16.Feb.2007
61	Wasserleitung	20.Nov.2006	20	15.Dez.2006
62	Wasserleitung	15.Jan.2007	25	16.Feb.2007
63	Versorgungsleitungen	20.Nov.2006	20	15.Dez.2006
64	Versorgungsleitungen	15.Jan.2007	25	16.Feb.2007
65			0	
66	Baustraße	20.Nov.2006	20	15.Dez.2006
67	Baustraße	15.Jan.2007	30	23.Feb.2007
68			0	
69	bituminöse Baustraße	26.Feb.2007	5	02.Mär.2007
70			0	
71			0	
72	**Anbindung Dammtorfeld**		0	
73	Verlängerung Wasserleitung	18.Sep.2006	5	22.Sep.2006
74	Straßenausbau	18.Sep.2006	25	20.Okt.2006
75			0
